

# Projektbericht Lebendige Stever in Senden


Stand der baulichen Umsetzung am 21.12.2018

# Gliederung

- **Stand der Umsetzung**
- **Weitere Arbeiten in 2019**

**1.BA Stever, im Bereich der Lebenshilfe:**

- Geh- und Radweg freigegeben (ab 21.12.2018)
- Anpflanzung von Bäumen
- Straßenbeleuchtung (60% fertig)
- Arbeiten am Aufenthaltsbereich (Fugen, Versiegelung und Grünflächeneinsaat stehen noch aus, witterungsabhängig)

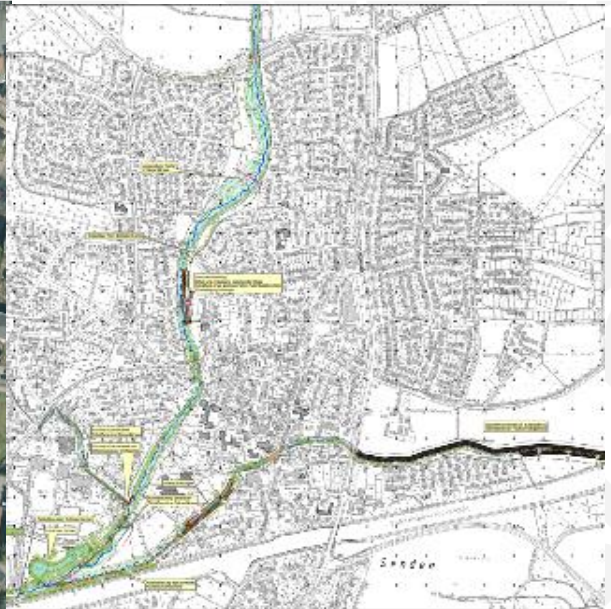



## Baustart an der Lebenshilfe im Juli 2017



August 2017



September 2017



September 2018



Oktober 2018

**2.BA Hagenkamp und Stau Schulze-Bremer**  
November 2017 bis Mai 2018





## Entschlammung der Teiche und Rückbau Stau Schulze-Bremer



November 2017



Januar 2018



Januar 2018



Februar 2018



Februar 2018

## Entschlammung der Teiche und Rückbau Stau Schulze-Bremer



März 2018

21.12.2018


Gemeinde Senden | Vorname Name



März 2018



## Abschnitt oberhalb im Juli 2018

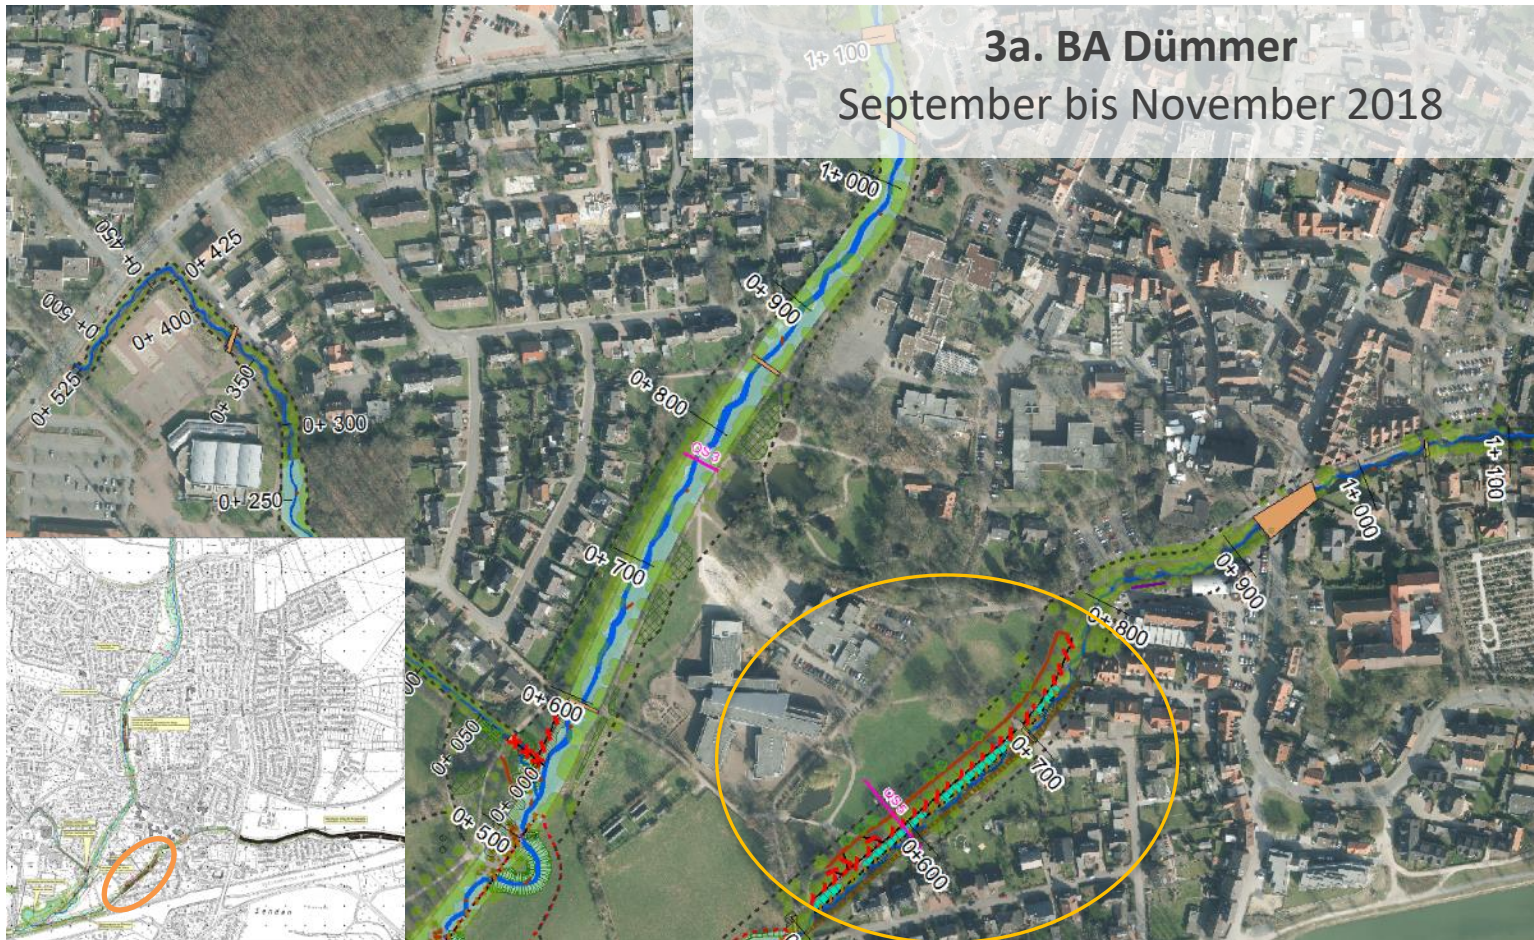




Oktober 2018







## Abnahmen Dezember 2018

- Weitere Maßnahmen in 2019

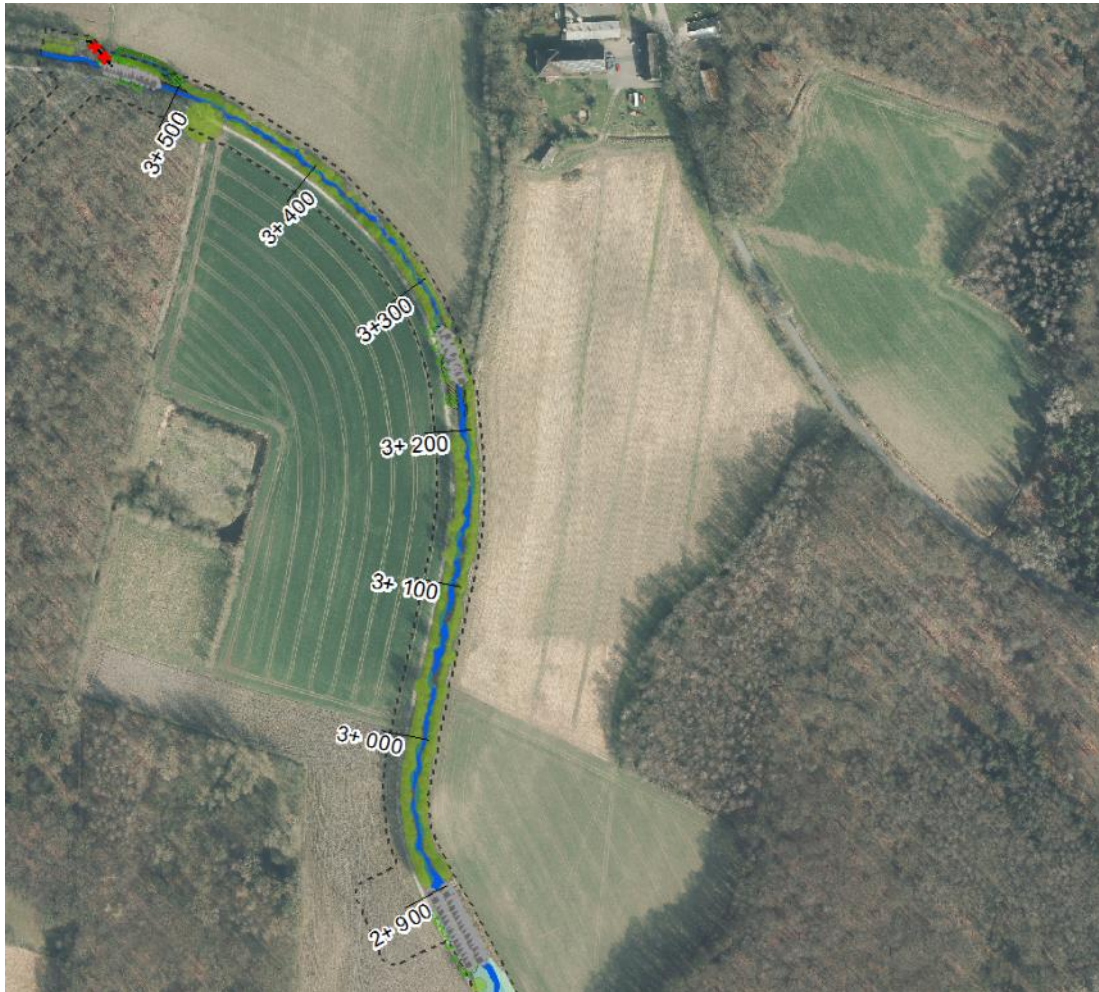

**3b. BA Obere Querbauwerke**  
Steuer Januar bis Mai 2019

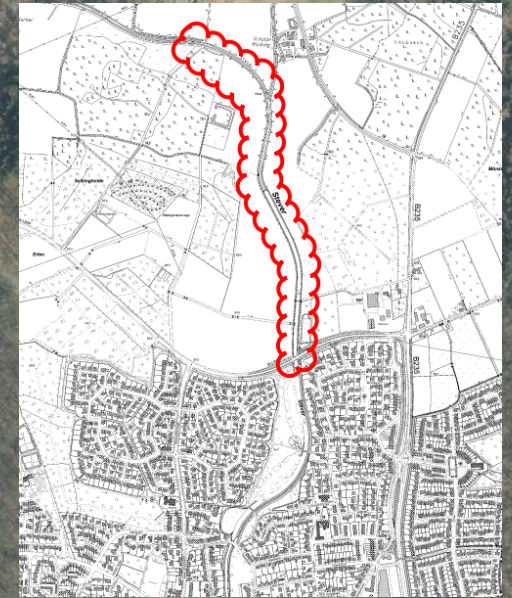

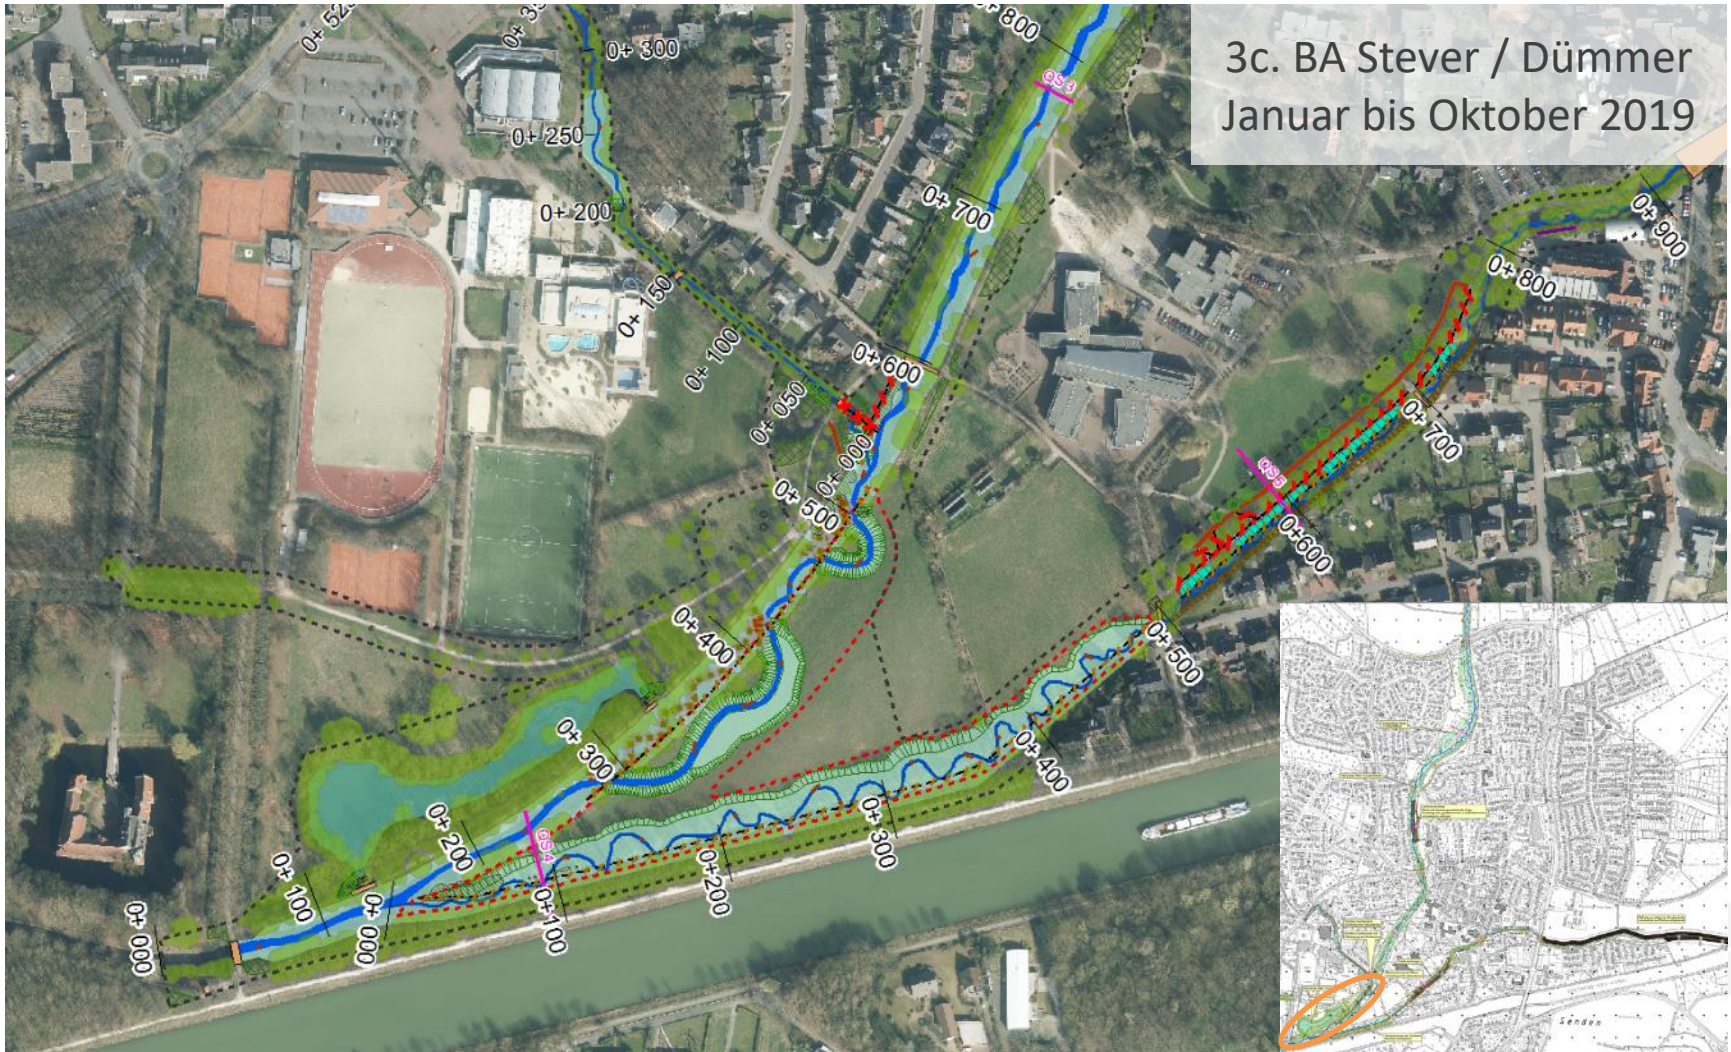

## Fazit

- **Geplante Fertigstellung in 2019 im Soll**
- **Gesamtbudget bislang im Soll**
